



OF. ORD. N° 497.-  
ANT.: Reunión informativa temas vialidad según indica.  
MAT.: Solicita confirmar asistencia reunión del 16-08-2012.

Puerto Aysén, 14 de agosto de 2012.

DE : SRA. FELISA OJEDA VARGAS  
GOBERNADORA PROVINCIAL DE AYSÉN

A : SR. LEONARDO GARCÍA GODOY  
DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD

1. Junto con saludarle, de acuerdo a lo conversado, manifiesto a Ud. la necesidad de contar de vuestra presencia y la de la funcionaria Beatriz Mena, en reunión que se realizará el día 16 de agosto del año en curso, a las 16:00 horas, en el Salón de reuniones de la Gobernación Provincial de Aysén. La que tiene por finalidad informar a Organizaciones Sociales y Comunitarias el Estado de avance de los proyectos "Conservación Puente Presidente Ibáñez e informe Contrato Construcción bypass Pto. Aysén - Pto. Dum".
2. Agradeceré confirmar asistencia al teléfono 336261 o al mail [hampuero@gmail.com](mailto:hampuero@gmail.com)
3. Esperando contar con vuestra presencia.

Saluda atentamente a Ud.,



FELISA OJEDA VARGAS  
GOBERNADORA PROVINCIAL DE AYSÉN

*FOV*  
FOV/OMJI/hag  
Distribución:  
- La Indica  
- Archivo Planificación  
- Archivo Gabinete  
- Oficina de Partes



**ACTA REUNIÓN PARTICIPACION CIUDADANA “CONSTRUCCIÓN VARIANTE EN PUERTO AYSÉN, TRAMO 1 CRUCE RUTA 240 (CAMINO ANTIGUO) - CAMINO PUERTO DUN KM. 0,000 A KM. 1.128; TRAMO 2 CAMINO LAGO RIESCO - RIBERA SUR KM. 1.440 A KM. 4.793 y REPARACIÓN PÉNDOLAS PUENTE IBÁÑEZ”.**

En el marco de las políticas de Participación Ciudadana desarrolladas por la Dirección de Vialidad, se realiza esta reunión de Participación Ciudadana para presentar las obras asociadas al contrato “Construcción Variante en Puerto Aysén, Sector Cruce Ruta 240 (camino antiguo Puerto Aysén) - Ribera Sur, Tramo 1 Cruce Ruta 240 (camino Antiguo) - Camino Puerto Dun Km. 0,000 a Km. 1.128; Tramo 2 Camino Lago Riesco - Ribera Sur Km. 1.440 a Km. 4.793, Comuna de Aysén, Provincia de Aysén, Región de Aysén”. Reunión en la que además se presentaron las obras de Reparación de las Péndolas del Puente Ibáñez. Reunión que se realizó el día jueves 16 de Agosto de 2012, en Puerto Aysén.

La empresa contratista que está desarrollando las obras es la constructora Claro Vicuña Valenzuela. El contrato tendrá una duración de 460 días, desde el 03 de enero 2012, hasta el 06 de abril de 2013. Plazo que será ampliado por las movilizaciones de comienzos de año.

En esta reunión se hizo una descripción de las obras proyectadas y de los beneficios que generará, además de recoger inquietudes y dudas de los asistentes, con el fin de incorporarlos al desarrollo de las obras, de acuerdo a su factibilidad técnica-económica.


**OBJETIVO DEL PROYECTO:**

Construir una variante a la Ciudad de Puerto Aysén para descongestionar de tránsito pesado el sector urbano, así como para dotar de un nuevo puente que permita cruzar el Río Aysén.

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Proyecto completo comprende distintas etapas, siendo esta la primera de ellas. En esta etapa del Proyecto se ejecutarán las **Obras Básicas**, es decir, se conformará el paquete estructural que, en las etapas siguientes, soportará el pavimento propiamente tal.


El perfil tipo de las obras es el siguiente:

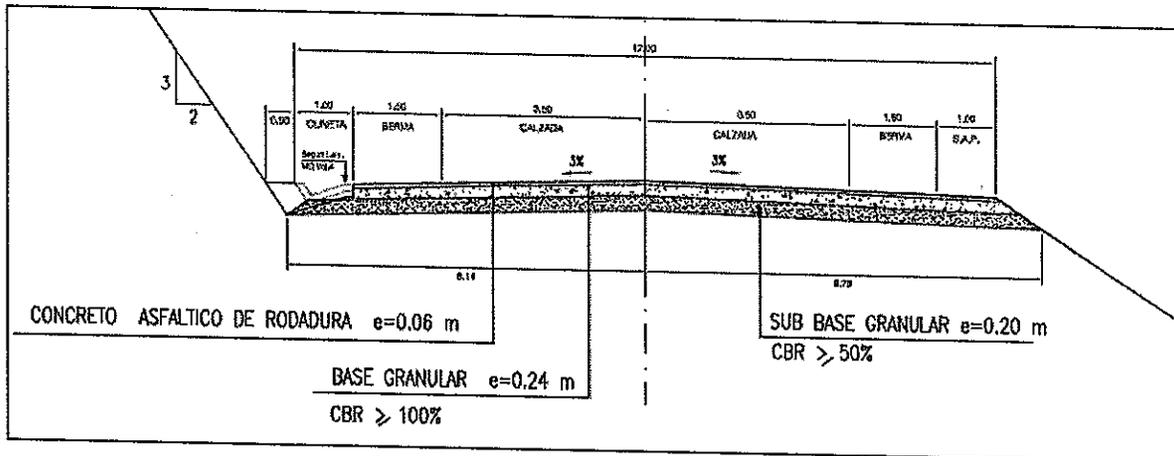


Las etapas siguientes consideran:

- Construcción Puente, Longitud aprox. 230 mts.
- Pavimentación.


El emplazamiento de las obras es el siguiente:

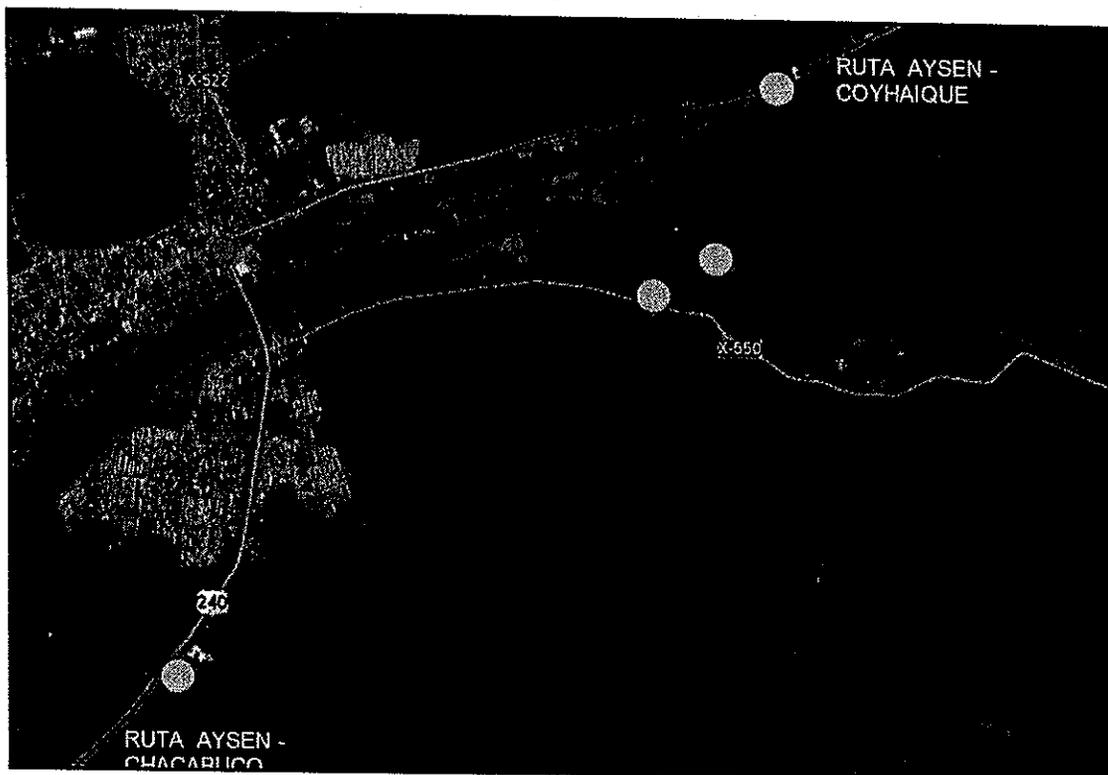

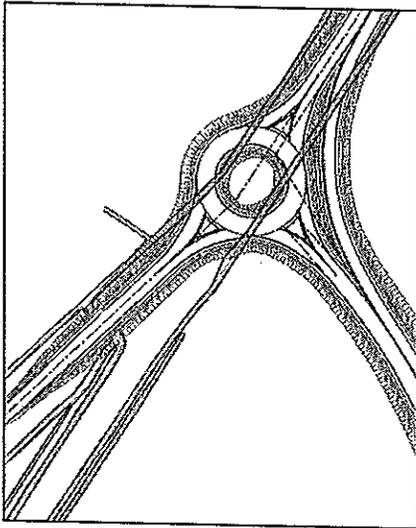


### ROTONDA RUTA AYSÉN - COYHAIQUE

Esta parte del Proyecto no se encuentra incluida en esta 1º etapa de construcción, quedando solo hasta empalmar con la Ruta Aysén - Coyhaique

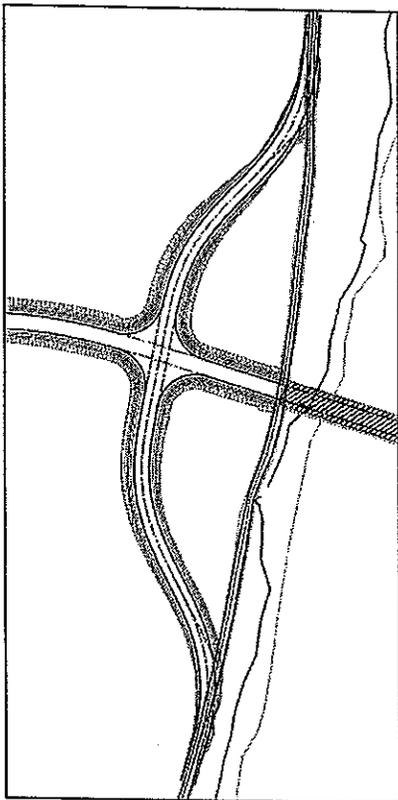


### EMPALME CAMINO PTO. DUN

Este empalme se encuentra incluido dentro de esta 1º Etapa de construcción, considerando que no altera ni interfiere mayormente con el camino existente.

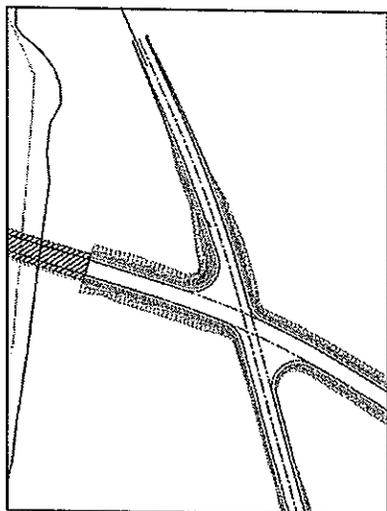

### EMPALME CON CAMINO LAGO RIESCO

Esta parte del Proyecto no se encuentra incluida en esta 1º etapa de construcción, quedando solo hasta empalmar con camino Lago Riesco.

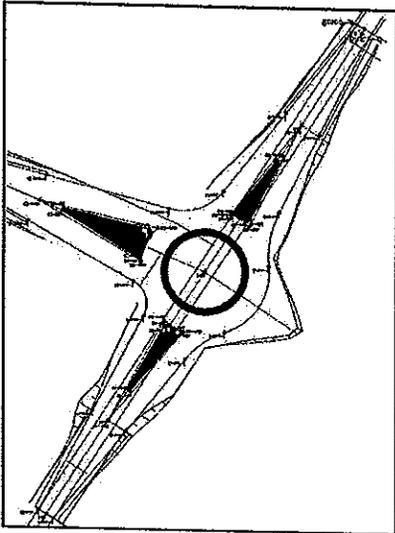

### ROTONDA RUTA AYSÉN - CHACABUCO

Esta parte del Proyecto no se encuentra incluida en esta 1º etapa de construcción, quedando solo hasta empalmar con la Ruta Aysén – Chacabuco

### MEDIDAS DE MITIGACIÓN

- Para evitar la circulación constante de camiones, máquinas y equipos entre uno y otro lado del río, el Proyecto se abordará como dos zonas de trabajo independientes, con recursos propios de cada sector, Ribera Norte y Ribera Sur, con pozos de empréstito en cada sector, evitando congestionar el Puente Presidente Ibáñez.
- Se construirán cercos en todas las áreas intervenidas por las Obras, de tal manera que se evite la salida de animales, tanto a las Obras nuevas como a la Ruta existente, reduciendo la probabilidad de accidentes en la vía.
- El Proyecto contempla la corta a tala rasa de 8,66 há, con el fin de materializar las Obras. Para estos efectos y como medida de mitigación compensatoria, existe Plan de Manejo de Obras Civiles, donde se contempla la reforestación de una superficie igual. Se ha contemplado realizar la reforestación entre los meses de Septiembre y Octubre de 2012, siempre que las condiciones climáticas lo permitan, de lo contrario se deberán planificar para el año 2013.
- Camiones encarpados para evitar caída de material en el transporte desde Pozo a faena
- Señalización de advertencia y precaución al aproximarse a la zona de trabajos.
- Casetas y personal de control de tránsito en acceso a zona de trabajos

- Mantenimiento de las vías o caminos de uso público.

Ruta 240 Pto. Aysén – Coyhaique:

- Se realiza el barrido del pavimento en la salida del Pozo y Acceso a las Obras con el fin de evitar accidentes por proyección de partículas.
- Se implementa la señalización necesaria para advertir a los usuarios de los trabajos que se realizan más adelante, así como también la necesidad de reducir la velocidad en el sector señalado como medida de precaución.


Camino Acceso Pto. Dun:

- Esta ruta está siendo utilizada por la Empresa para transporte de materiales desde Pozo a faena, realizándose una mantención con una frecuencia de aprox. 20 a 30 días, recargando los sectores dañados y perfilando con motoniveladora.
- Además se han reforzado los guardaganado existentes con el fin de evitar su deterioro y accidentes en caso de que estos se rompan por sobrecarga.

**AVANCE DE LAS OBRAS:**

Tramo Ruta 240 – Camino Acceso Pto. Dun, se encuentra con una 1º capa de terraplén en toda su longitud, iniciando los trabajos de colocación de geotextil y las capas subsiguientes.

Cabe mencionar que los terraplenes a ejecutar tienen una altura de aproximadamente 2,00 mts, indicándose como método constructivo, levantar el terraplén hasta la mitad de la altura proyectada, dando un período de asentamiento de dos meses, para posteriormente continuar su ejecución hasta la cota de proyecto.

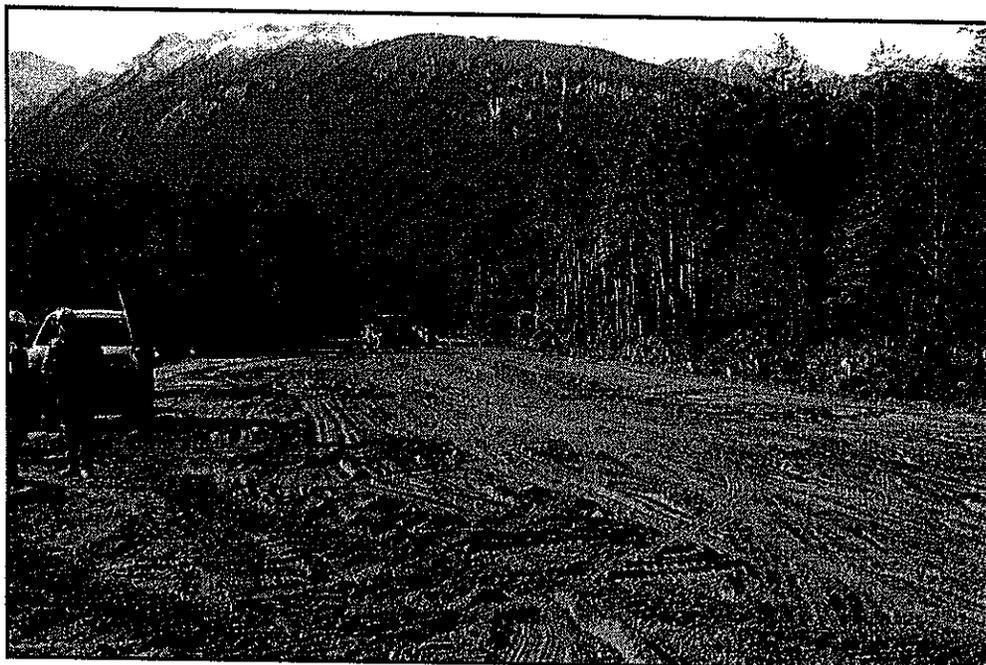

### **PREGUNTAS E INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD:**


- Pobladores: Representantes de juntas de vecinos y otras organizaciones solicitan acceder a la leña que se genere por la construcción del camino.
- Gobernadora: Se podría coordinar las solicitudes de leña a través de la Gobernación.
- Respuesta: En la medida que las solicitudes se realicen a través de la Gobernación, se puede coordinar las facilidades para que puedan retirar la leña de la faja.
  
- Poblador: ¿Qué pasa si no se autorizan los pozos de empréstito?  
Respuesta: La DV paga el material puesto en el camino, por lo que la empresa propone los empréstitos y consigue las autorizaciones pertinentes, propietario, municipalidad, etc.

### **ASISTENTES**


En la reunión se contó con la asistencia de representantes de la Gobernación, gremios del transporte, juntas de vecinos y pobladores del sector. Por parte de la Dirección Regional de Vialidad asistió el Director Regional, el jefe del Departamento de Contratos y el Encargado de Medio Ambiente y Territorio. Se adjunta listado de asistentes.

### **Fotografías de la Reunión**


**Fotografía N°1: Reunión en salón de la Gobernación de Aysén.**

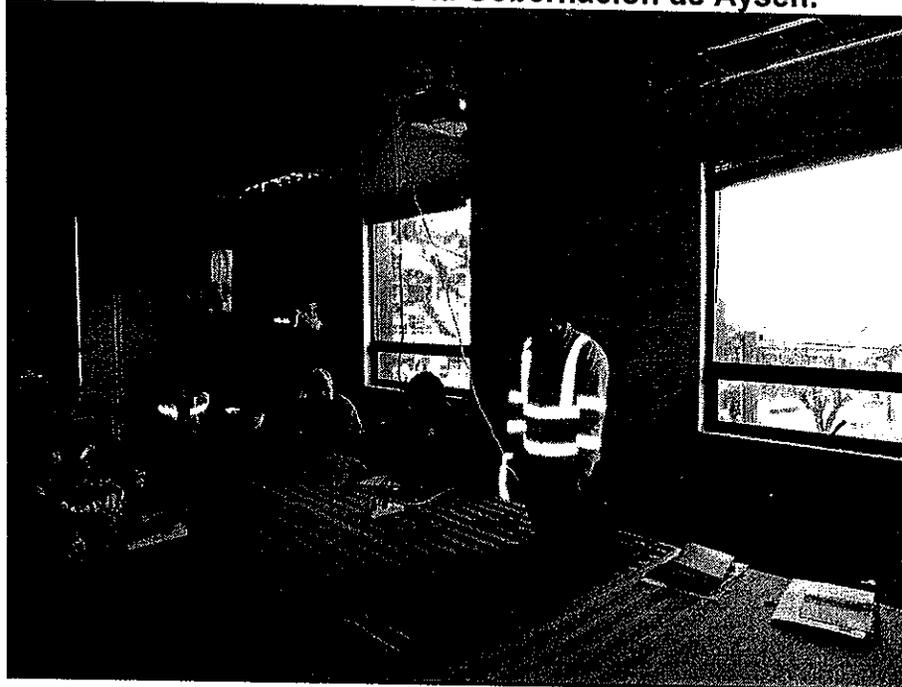



Fotografía N°2: Reunión en salón de la Gobernación de Aysén.

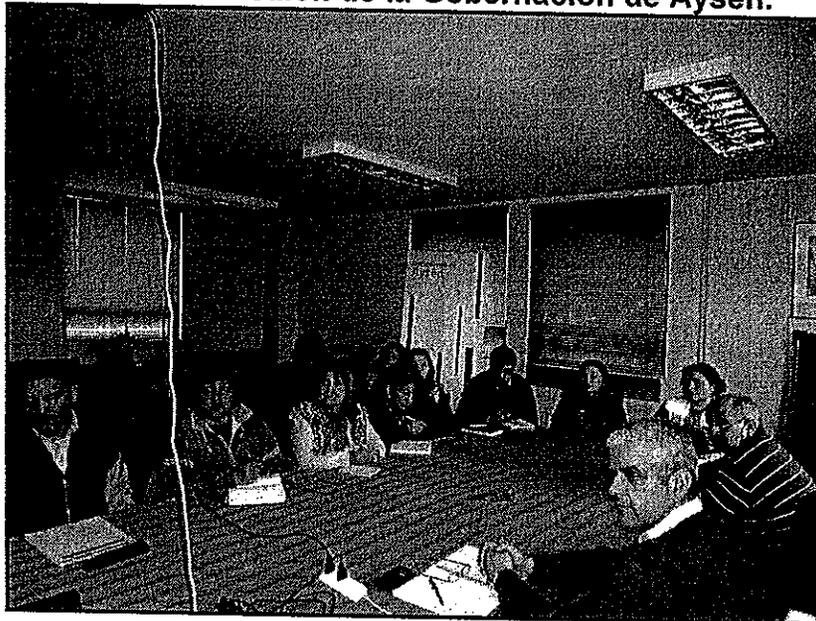

Fotografía N°3: Reunión en salón de la Gobernación de Aysén.

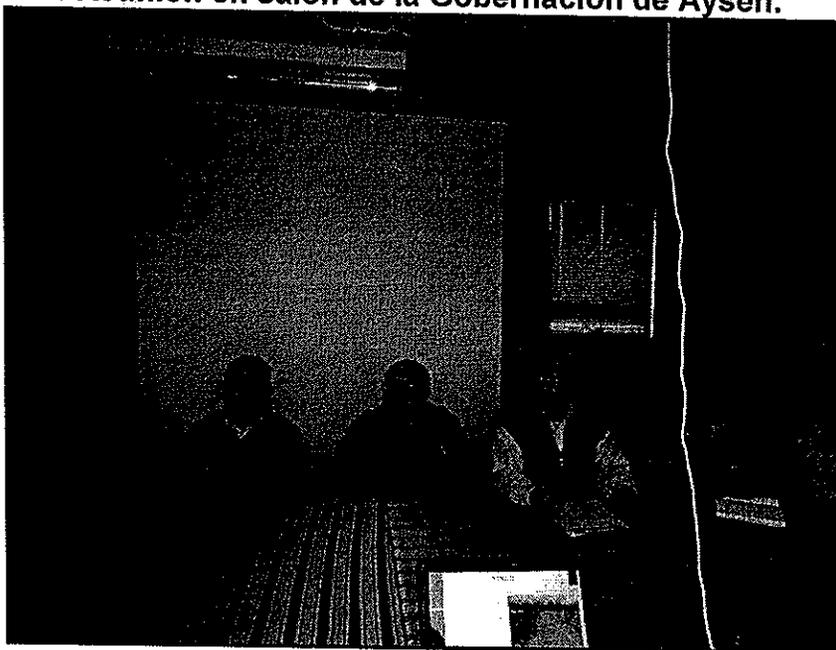

  
Leonardo García G.  
Director Regional de Vialidad  
Región de Aysén

  
Julio Bravo A.  
Jefe Depto. Contratos  
Dirección de Vialidad.  
Región de Aysén.

  
Arturo Gajardo L.  
Encargado de Medio Ambiente y Territorio  
Dirección de Vialidad.  
Región de Aysén.



ACTA REUNIÓN / 16 AGOSTO DE 2012

TEMA O CONVOCATORIA

REUNIÓN CONSERVACIÓN PUENTE PRESIDENTE IBÁÑEZ E INFORME CONTRATO CONSTRUCCIÓN BY-PASS PTO. AYSÉN - PTO. DUMI. CONSTRUCCIÓN PLAZA DE ARMAS DE PTO. AYSÉN Y PROYECTO DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO CALLE SGO. ALDEA

Localización	Convocatoria	Lugar reunión
Comuna : Aysén	Comunitaria: X	Gob. Prov. Aysén
Localidad: Pto. Aysén	Institucional:	

LISTADO DE PARTICIPANTES

Nombre del Participante	Servicio público u Organización Social	Correo electrónico y fono de contacto	Firma
1. César Fernández	VIDUAS PTO AYSÉN	cesar.fernandez@viduas.cl	[Firma]
2. Jorge Guenre	Constructora T.U.O	jorge.guenre@tuo.cl	[Firma]
3. Elsa Aldea	SETRU Región	elsa.aldea@setru.cl	[Firma]
4. Nelson Quintana	SONUV	nquintana@sonuv.cl	[Firma]
5. Olaya Salas	SONUV	o.salas@sonuv.cl	[Firma]
6. Luciano Castellón	U.C. U.C.C.	luciano.castellon@ucuc.cl	[Firma]
7. Ana Julia Lavilla	U.C. T.S.C.	ana.lavilla@ucuc.cl	[Firma]
8. Roberto Navarrete	U.C. T.T.U.	roberto.navarrete@ucuc.cl	[Firma]
9. María Hernández	Colchinos 3ª A	maria.hernandez@colchinos.cl	[Firma]
10. Pedro Villalón	TRANS. SURY AYSÉN	pedro.villalon@transury.cl	[Firma]
11. Oscar Bernal	RADIO TAXI	oscar.bernal@radio-taxi.cl	[Firma]
12. Wilson Carrión	Transporte W	wilson.carri@transporte-w.cl	[Firma]
13. Gabriela Bastidas	Venta de Lemas	gabrielabastidas@hotmail.com	[Firma]
14. Eleazar Mella	TAXIS AYSÉN	eleazar.mella@taxis-aysen.cl	[Firma]
15. Leonardo Jara	VIDUAS D.V.	leonardo.jara@viduas.cl	[Firma]
16. Carrión Felipe	Los Pinos Ofuc	carrion.felipe@lospinos.cl	[Firma]
17. Pablo Bernal	VIDUAS	pablo.bernal@viduas.cl	[Firma]
18. Pedro Rojas	VIDUAS	pedro.rojas@viduas.cl	[Firma]
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			

NOMBRE Y FIRMA  
 FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
