



429

ORD.: N° _____ /
ANT.: Mejoramiento Ruta 7 Sur, (Etapa I: Obras Básicas), Sector: Laguna Verde - Mallines - Cascada.
MAT.: Invita a reunión de Participación Ciudadana Mejoramiento Ruta 7 Sur, (Etapa I: Obras Básicas), Sectores:
• Laguna Verde - Mallines.
• Mallines - Cascada.

Coyhaique, **22 AGO. 2016**

DE : SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL (S) DE OBRAS PÚBLICAS
REGIÓN DE AYSÉN

A : SEGÚN DISTRIBUCION

Mediante el presente, tengo el agrado de informar a usted que el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad Región Aysén, se encuentra ejecutando los contratos "Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa I; Obras Básicas), Sector: Cerro Castillo – Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde - Mallines Río Ibáñez: Km 718,931 a Km 727,831; Comuna Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén" y "Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 Sur (Etapa I; Obras Básicas), Sector: Cerro Castillo – Alcantarilla Cascada, Tramo: Mallines Río Ibáñez – Alcantarilla Cascada: Km 727,831 a Km 737,031; Comuna Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén".

En consideración a lo anterior, lo invitamos a una reunión de Participación Ciudadana asociada a dichos contratos, que se efectuará el día **miércoles 31 de Agosto de 2016 a las 18:30 horas, en la Sede Vecinal de Villa Cerro Castillo.**

En dicha actividad se expondrán las obras de dichos contratos, sus alcances y se recogerán las inquietudes y dudas que surjan, de forma de generar la menor cantidad de inconvenientes posibles.

Con el objeto de lograr una organización más adecuada y, ante dudas o consultas, favor comunicarse al fono 67-2572070 con Don Arturo Gajardo, Dirección Regional de Vialidad MOP.

Agradeciendo su disposición a considerar esta invitación y esperando contar con vuestra presencia, saluda atentamente a Ud.



GERMAN URREA OJEDA
CONTADOR AUDITOR
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL (S)
OBRAS PUBLICAS REGION DE AYSEN

MVA/LGC/EBE/MDI/AGL/agl

DISTRIBUCIÓN:

- Según listado adjunto
- Departamento de Proyectos, DRV.
- Inspector Fiscal, Sr Enzo Barría E.
- Proceso N° 10147399.

Listado de Autoridades, Cuadros Técnicos y Comunidad Involucrada
Mejoramiento Ruta 7 Sur, OOBB, Sector: Laguna Verde - Mallines - Cascada

Organismo	Cargo	Nombre
Intendencia Región de Aysén	Intendente Regional	Jorge Calderón Núñez
Intendencia Región de Aysén	Jefe de Gabinete	Claudia Hernández Oyarzo
Gobernación Provincia General Carrera	Gobernadora	María Rivera Yañez
Gobernación Provincia General Carrera	Jefe de Gabinete	Mario Figueroa Mayorga
Ilustre Municipalidad Río Ibáñez	Alcalde	Luis Emilio Alarcón Escobar
Ilustre Municipalidad Río Ibáñez	Concejales	Claudia Fuentes Catalán
Ilustre Municipalidad Río Ibáñez	Concejales	Julio Figueroa Lavados
Ilustre Municipalidad Río Ibáñez	Concejales	Hugo Morales Antrillao
Ilustre Municipalidad Río Ibáñez	Concejales	José Vargas Bahamondes
Ilustre Municipalidad Río Ibáñez	Concejales	Nelson Medina
Ilustre Municipalidad Río Ibáñez	Concejales	Washington Medina
Gobierno Regional de Aysén	Consejeros Regionales Comisión Infraestructura	Miguel Angel Callisto Aguilera Carlos Campos Saigg Ariel Keim Hermosilla Eduardo Vera Wandersleben
Gobierno Regional de Aysén	Consejero Regional Provincia General Carrera	Ariel Keim Hermosilla
Gobierno Regional de Aysén	Consejero Regional Provincia General Carrera	Jorge Hereme Hasen
Transportes y telecomunicaciones	SEREMI	Alejandra Aguilar Gallardo
SERNATUR	Director	Cristian Alarcón Mendoza
Buses Acuario 13	Contacto	Gastón Fuentes
Buses Don Carlos	Contacto	Sociedad Triple C
Buses Sao Paulo	Contacto	Inés Peña
Asociación Gremial de Transportistas de Dueños de Camiones	Presidente	Juan Vera Durán
AG de Transportistas de Dueños de Camiones		Silvio Vera B.
AG de Transportistas de Dueños de Camiones		Javier Rosas Soto
AG de Transportistas de Carga y Pasajeros Zona Austral	Presidenta	Drina Montenegro
Cornité Agua Potable Rural	Presidenta	
Junta de Vecinos N°3	Presidenta	Mirian Schoenfeldt Vásquez
Adulto Mayor	Presidente	Lindor González
Cornité de Vivienda villa nueva	Presidenta	Marcia Álvarez
Radio Aluen	Locutora	Daisy Lavado
A.G. Turismo, Social y Cultural	Presidente	Jorge Aguilar Chacano
Escuela Cerro Castillo	Director	Abel González Ojeda
Jardín Infantil Pequeños Caminantes	Directora	Monica Cárdenas Oyarzo
Biblioteca	Bibliotecaria	Edith Aguilar Chacano
Posta Rural	Paramédico Encargado	Jorge Pailapan

Carabineros de Chile, Tenencia Puerto Ingeniero Ibáñez (F)			
Comunidad Indígena Trabun	Presidenta	Rosa Martel Hueltra	
	Vecino	Edith Aguilar	
	Vecino	Jorge Aguilar	
	Vecino	Eduardo Antrillao	
	Vecino	Federico Carvajal	
	Vecino	Archivaldo Chacano	
	Vecino	Rosa Martel	
	Vecino	Cesar Moya	
	Vecino	Agueda Muñoz	
	Vecino	Magaly Romero	
	Vecino	Marjorie Rifo San Martín	
	Vecino	Robinson Troncoso	





ORD.: N° 444 /

ANT.: Ord SRM 429.

MAT.: Invita a reunión de Participación Ciudadana Mejoramiento Ruta 7 Sur, (Etapa I: Obras Básicas), Sectores:

- Laguna Verde - Mallines.
- Mallines - Cascada.

Coyhaique, **25 AGO. 2016**

DE : SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICAS
REGIÓN DE AYSÉN

A : SEGÚN DISTRIBUCION

Mediante el presente, tengo el agrado de informar a usted que el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Vialidad Región Aysén, se encuentra ejecutando los contratos "Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa I; Obras Básicas), Sector: Cerro Castillo – Alcantarilla Cascada, Tramo: Laguna Verde - Mallines Río Ibáñez: Km 718,931 a Km 727,831; Comuna Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén" y "Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 Sur (Etapa I; Obras Básicas), Sector: Cerro Castillo – Alcantarilla Cascada, Tramo: Mallines Río Ibáñez – Alcantarilla Cascada: Km 727,831 a Km 737,031; Comuna Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén".

En consideración a lo anterior, en el marco del proceso de Participación Ciudadana y la Ley 18.700, respecto de cursar invitaciones por escrito a todos los candidatos del respectivo territorio electoral; invitamos cordialmente a usted a la reunión para presentar el desarrollo de ambos contratos, que se realizará el día **miércoles 31 de Agosto de 2016 a las 18:30 horas, en la Sede Vecinal de Villa Cerro Castillo.**

Con el objeto de lograr una organización más adecuada y, ante dudas o consultas, favor comunicarse al fono 67-2572070 con Don Arturo Gajardo, Dirección Regional de Vialidad MOP.

Agradeciendo su disposición a considerar esta invitación y esperando contar con vuestra presencia, saluda atentamente a Ud.



MARCIO VILLOUTA ALVARADO
INGENIERO FORESTAL
SECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL
OBRAS PÚBLICAS REGIÓN DE AYSÉN


MVA/LGG/EBE/MDI/AGL/agl

DISTRIBUCIÓN:

- Según listado adjunto
- Departamento de Proyectos, DRV.
- Inspector Fiscal, Sr Enzo Barría E.
- Proceso N° **10161393**.

Listado de Candidatos Comuna de Río Ibáñez

Candidato	Nombre	Correo
Alcalde	Medina Martinez Washington Alejandro	
Alcalde	Santana Vargas Marcelo Orlando	
Concejal	Alarcon Barria Franchesca	
Concejal	Alvarez Valencia Marcia Alejandra	
Concejal	Antrillao Abarzua Arturo	
Concejal	Aravena Castillo Hugo Patricio	
Concejal	Arevalo Hernandex Sandro Alexis	
Concejal	Berrocal Millapinda Patricia	
Concejal	Catalan Gavilan Renan	
Concejal	Catalan Martinez Renan	
Concejal	Figueroa Lavado Julio Cesar	
Concejal	Figueroa Quirogran Uberlinda	
Concejal	Fuentes Catalan Claudia	
Concejal	Gatica Vargas Georgina	
Concejal	Higuera Molina Loreto	
Concejal	Llunca Mercado Eva Del Carmen	
Concejal	Morales Antriyao Hugo Cesar	
Concejal	Reyes Barria Gonzalo	
Concejal	Reyes Rivas Mario	
Concejal	Sandoval Poblete Ruben Ambrosio	
Concejal	Schoenfeldt Vasquez Miryam	
Concejal	Vera Ojeda Eduardo Antonio	

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES S.A	Código : F-A331- Versión: AR Fecha : 06.10.15
	ACTA DE REUNION	


Asesoría a la Inspección Fiscal; 1) "Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa 1, Obras Básicas) Sector Cerro Castillo – Alcantarilla Cascada, Tramo Laguna Verde, Mallines Río Ibáñez; Km. 718,931 a Km. 727,831, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén". 2) "Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa 1, Obras Básicas) Sector Cerro Castillo – Alcantarilla Cascada, Tramo Mallines Río Ibáñez – Alcantarilla Cascada; Km. 727,831 a Km. 737,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén".

LUGAR: Sede Comunitaria Junta de Vecinos – Villa Cerro Castillo			
Fecha / Horas	31-Agosto-2016	Inicio 18:30 hrs	Final 19:30 hrs
Próxima reunión		Inicio	Final

Agenda	
	De acuerdo a lo establecido en las Bases del Contrato, se realiza Reunión de Participación Ciudadana con el objeto de presentar a la comunidad las obras en ejecución, y a la vez conocer sus inquietudes sobre la materia.

Revisión acuerdos reunión anterior	
	No Hay.

Exposición, inquietudes y acuerdos	
1.-	Siendo las 18:30 hrs. el Sr. Enzo Barría Escobar, Inspector Fiscal de las obras da inicio a la Reunión de Participación Ciudadana establecida en las exigencias contractuales de los contratos de obra, ante la presencia de autoridades comunales, de organizaciones de adelanto, propietarios de predios adyacentes y comunidad en general en la sede comunitaria de la localidad de Villa Cerro Castillo.
2.-	<p>A continuación el Sr. Inspector Fiscal junto con agradecer su participación a los presentes, realiza una exposición audio-visual en la cual expone para cada uno de los contratos en ejecución los siguientes aspectos:</p> <p>Antecedentes Contractuales y Ubicación de las Obras</p> <p>Se expone una secuencia que comprende: monto de inversión, plazo de ejecución, empresas contratistas, empresa de asesoría a la inspección fiscal, avances a la fecha, mano de obra ocupada, y ubicación de los contratos entre otros.</p> <p>Características técnicas de los proyectos</p> <p>Se presenta un perfil tipo de las obras en ejecución junto a las principales partidas que contempla, y se expone las etapas de construcción necesarias para alcanzar finalmente la plataforma proyectada, junto a las obras anexas necesarias para permitir garantizar la seguridad vial como ser: Barreras de contención, Señalización y Cerco especial delimitador de la propiedad pública.</p> <p>Avance de las principales partidas</p> <p>Se presenta en porcentaje los avances a la fecha de las principales partidas en ejecución en cada uno de los contratos.</p> <p>Mano de Obra</p> <p>Se presenta un resumen de la mano de obra ocupada en cada contrato por mes de trabajo, con una presentación de la participación de mano de obra femenina.</p>

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES S.A	Código : F-A331- Versión: AR Fecha : 1 : 06.10.15
	ACTA DE REUNION	

Asesoría a la Inspección Fiscal; 1) “Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa 1, Obras Básicas) Sector Cerro Castillo – Alcantarilla Cascada, Tramo Laguna Verde, Mallines Río Ibáñez; Km. 718,931 a Km. 727,831, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén”. 2) “Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa 1, Obras Básicas) Sector Cerro Castillo – Alcantarilla Cascada, Tramo Mallines Río Ibáñez – Alcantarilla Cascada; Km. 727,831 a Km. 737,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén”.

Información para Comunicación

Se entrega una breve síntesis de datos personales, teléfono y correo electrónico de autoridades de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad y las Empresas Contratistas, para permitir la comunicación con la comunidad.

3.- Luego y durante parte de la exposición anterior, los presentes representados por las autoridades comunales, representantes de organizaciones locales, propietarios de predios adyacentes a la ruta y vecinos en general plantean diversas inquietudes, sobre las cuales el Sr. Inspector Fiscal responde conforme se indica a continuación:

Pregunta: *Se observa que durante el proceso de cierre de algunos botaderos en el tramo I: Cerro Castillo – Laguna Verde, no se ha cubierto adecuadamente con tierra vegetal la superficie de material depositado.*

Respuesta: Se aclara que muchos de estos depósitos aún no han sido cerrados, y por ello no cuentan con recepción de la Inspección Fiscal.

Pregunta: *Se consulta sobre la continuación de trabajos en el sector comprendido entre Dm 107.300 y Dm 108.000, sector en el cual solo se ha iniciado cortes en roca recientemente.*

Respuesta: A la fecha se encuentra en ejecución trabajos en dicho sector y se encuentra en evaluación las cantidades totales de obra a ejecutar en ese tramo, por lo cual no se ha definido un porcentaje de avance que se pueda alcanzar en el sector.


Pregunta: *En relación a la extracción de áridos en empréstito aprobado en el Río Sin Nombre, se consulta sobre el volumen extraído a la fecha, y la supuesta explotación en periodos nocturnos.*

Respuesta: Se informa que luego de revisados los volúmenes extraídos se ha determinado que aún no se completa el total autorizado. Por otra parte en relación a la extracción nocturna de material, esto queda condicionado legalmente por la autorización de jornadas especiales de trabajo por turnos durante el día.

Pregunta: *Se expone la inquietud de propietarios de predios adyacentes a cauces en que se ha autorizado la extracción de áridos, sobre las reales áreas intervenidas.*

Respuesta: Se informa a los presentes, que durante los procesos de control efectuados por la A.I.F., y con ocasión de visitas de personal de la Dirección de Obras Hidráulicas, no se ha detectado irregularidades sobre la materia.

Pregunta: *Se plantea la molestia de los propietarios de predios sobre la proyección de material proveniente de tronaduras de corte en roca, y una supuesta intención de las empresas contratistas de disponer material fuera de la faja del camino.*

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES S.A	Código : F-A331- Versión: AR Fecha : 1 : 06.10.15
	ACTA DE REUNION	

Asesoría a la Inspección Fiscal; 1) "Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa 1, Obras Básicas) Sector Cerro Castillo – Alcantarilla Cascada, Tramo Laguna Verde, Mallines Río Ibáñez; Km. 718,931 a Km. 727,831, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén". 2) "Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa 1, Obras Básicas) Sector Cerro Castillo – Alcantarilla Cascada, Tramo Mallines Río Ibáñez – Alcantarilla Cascada; Km. 727,831 a Km. 737,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén".

Respuesta: Se informa que de acuerdo a las exigencias establecidas para la ejecución de trabajos con explosivos, los contratistas deben tomar los resguardos necesarios para proteger la propiedad privada, sin perjuicio que una supuesta intención de disponer material lejos del área intervenida no resultaría beneficioso para las empresas constructoras, debido a la obligatoriedad contractual de reparar el daño causado.

Pregunta: *Se consulta sobre cortes de tránsito por tronaduras realizados los días sábado, al parecer sin conocimiento de la comunidad y/o usuarios de la ruta.*

Respuesta: Se informa que con motivo de emergencias acontecidas ya sea de pacientes de los centros de salud, o por accidentes de tránsito, se debió especialmente en época de verano solicitar a las empresas contratistas suspender los cortes de tránsito programados para permitir el paso de los vehículos de emergencia, lo que

posteriormente debió ser compensado por ejecución de tronaduras durante igual número de días sábados, avisado vía radial de igual manera como se efectúa regularmente.

Pregunta: *Se consulta sobre las características de la superficie final de rodadura, toda vez que en la actualidad en algunos sectores la circulación se realiza sobre un material sin cohesión.*

Respuesta: Se informa que aquellos sectores sin cohesión corresponden a terraplenes, los cuales luego de terminados reciben una capa de sub-base, la cual toda vez que posee un % de material fino que le otorga cohesión, conforma una superficie de rodado adecuada.


Pregunta: *Se plantea la molestia de trabajadores, especialmente del sector de Pto. Ibáñez, los cuales son recogidos cerca de las 6:30 a.m., toda vez que las labores se inician cerca de las 8:30 hrs., lo cual permitiría una salida más tarde desde sus hogares.*

Respuesta: Sin perjuicio de la programación de inicio de labores que puedan realizar las empresas contratistas, el inicio por contrato de la jornada laboral es a las 8:00 hrs.

Pregunta: *Se expone la inquietud de pobladores de la ribera norte del Río Ibáñez, sobre los efectos adversos que pueda generar las crecidas del río en ese sector, toda vez que depósitos de roca en la ribera sur, especialmente en el Tramo Dm 120 a Dm 121 al parecer confinaría el lecho del cauce.*

Respuesta: Los depósitos de roca citados tienen como objetivo proteger la estructura del nuevo proyecto, y se han autorizado evitando una reducción de la sección de escurrimiento del cauce, sin perjuicio que situaciones puntuales que puedan observarse a la fecha, deben ser corregidas por la empresa contratista.

Pregunta: *En relación a la pregunta anterior, se solicita la visita o estudio de parte de la Dirección de Obras Hidráulicas para verificar el compromiso del área norte del valle del Río Ibáñez frente a eventuales crecidas del cauce.*

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA ZAÑARTU INGENIEROS CONSULTORES S.A	Código : F-A331- Versión: AR Fecha : 1 : 06.10.15
	ACTA DE REUNION	

Asesoría a la Inspección Fiscal; 1) "Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa 1, Obras Básicas) Sector Cerro Castillo – Alcantarilla Cascada, Tramo Laguna Verde, Mallines Río Ibáñez; Km. 718,931 a Km. 727,831, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén". 2) "Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa 1, Obras Básicas) Sector Cerro Castillo – Alcantarilla Cascada, Tramo Mallines Río Ibáñez – Alcantarilla Cascada; Km. 727,831 a Km. 737,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén".

Respuesta: El Sr. Inspector Fiscal se compromete a gestionar la participación de la D.O.H. sobre la materia.

Pregunta: *Se plantea la inquietud de los propietarios sobre inundaciones de áreas de pastoreo, debido a la descarga de obras de arte transversales.*

Respuesta: Se considera abordar la situación generada para cada caso en particular en acuerdo con los propietarios.

Pregunta: *Se consulta sobre fechas y disposición de fondos, para la ejecución de obras de pavimentación en los sectores en que se ejecutan actualmente contratos de obras básicas.*

Respuesta: Se encuentra revisado el proyecto de pavimentación correspondiente al tramo: Cerro Castillo – Laguna Verde, lo que significa que al contar con los fondos necesarios se licitaría el primer semestre del próximo año.

Pregunta: *Se consulta sobre la continuación de los trabajos de mejoramiento de la Ruta 7 hacia el sur.*

Respuesta: No se dispone de información sobre la consulta, sin perjuicio que se cuenta con diseño de proyectos de obras, hasta el sector de Bahía Murta.

4.-

Siendo las 20:00 hrs., no existiendo más inquietudes de los participantes, el Sr. Inspector Fiscal nuevamente presenta sus agradecimientos a los asistentes y da por finalizada la reunión.

5.-

Fotografías






SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA
ZAÑARTU INGENIEROS
CONSULTORES S.A
ACTA DE REUNION

Código : F-A331-
Versión: AR
Fecha : 1
06.10.15

Asesoría a la Inspección Fiscal; 1) "Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa 1, Obras Básicas) Sector Cerro Castillo – Alcantarilla Cascada, Tramo Laguna Verde, Mallines Río Ibáñez; Km. 718,931 a Km. 727,831, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén". 2) "Mejoramiento Camino Longitudinal Austral Ruta 7 (Etapa 1, Obras Básicas) Sector Cerro Castillo – Alcantarilla Cascada, Tramo Mallines Río Ibáñez – Alcantarilla Cascada; Km. 727,831 a Km. 737,031, Comuna de Río Ibáñez, Provincia General Carrera, Región de Aysén".

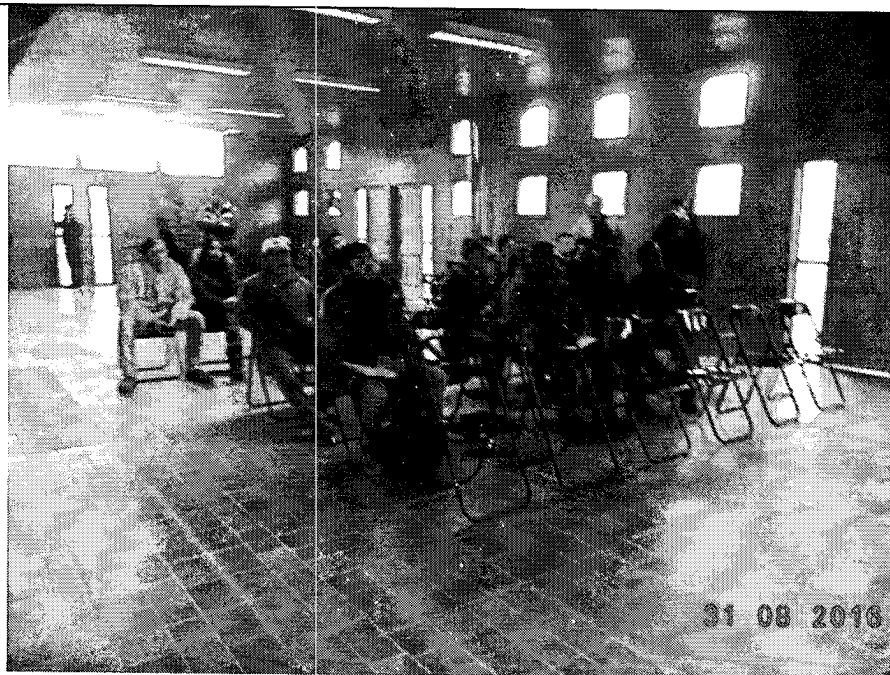

6.-

Asistencia

Se adjunta Lista de Asistentes a la reunión.

ENZO WLADIMIR BARRIA ESCOBAR
Ingeniero Constructor - Insp. Fiscal de Obras
Departamento de Contratos
Dirección de Vialidad - Región de Aysén

Río Ibáñez, 31 de Agosto de 2016.-



LISTA DE ASISTENCIA

Villa Castillo, 31 de Agosto 2016.

REUNIÓN: MEJORAMIENTO RUTA 7 (Obras Básicas), TRAMO: Laguna Verde - Mallines Río Ibáñez.
MEJORAMIENTO RUTA 7 (Obras Básicas), TRAMO: Mallines Río Ibáñez - Alcantarilla Cascada.

NOMBRE	ORGANIZACIÓN	DIRECCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Alfonso Morales	Concesion. Río Ibáñez	Sto Domingo			[Firma]
Thelma Benavides	Tramo 3 Empresaria	Alto Río Ibáñez			[Firma]
Penny PARAG	AIF BARRAN	Río Ibáñez			[Firma]
Fernando Pablos	EXCO	C. Castillo			[Firma]
PATRICIA RIVERA GÓMEZ	EXCON	C. Castillo			[Firma]
Leonardo Tinera F.	EXCON	C. Castillo			[Firma]
Daniel Carreras	San Felipe S.A	Industria de Fierro Suiza			[Firma]
Orlando	Camperina	Alto Río Ibáñez			[Firma]
Eduardo Antrillo	Camperina	Villa Castillo			[Firma]
Elisana Miranda	empresaria	Villa Ceno Castilla			595766 [Firma]



LISTA DE ASISTENCIA

Villa Castillo, 31 de Agosto 2016.

REUNIÓN: MEJORAMIENTO RUTA 7 (Obras Básicas), TRAMO: Laguna Verde - Mallines Río Ibáñez.

MEJORAMIENTO RUTA 7 (Obras Básicas), TRAMO: Mallines Río Ibáñez - Alcantarilla Cascada.

NOMBRE	ORGANIZACIÓN	DIRECCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Amor Pizarro	OME MI	IBÁÑEZ			
Claudia Fuentes	Concejal	Pto Mbañez			
German Dizon	Vecino turno 3	Alto Río Ibáñez Km 120			
Graciela Medina C.	SAN FELIPE SA	Castillo			
José Parina F.	SAN FELIPE SA	Pto Ibáñez			
Amor Barrientos E	Compechino	Alto Ibáñez			
DENIS ROQUEZ ✓	VIALIDAD	Riaveme 465			
Claudio Guoza	Riaveme 465	Villa Cauco			
PAULO BRUNNENROTT O.	FUND. PATAGONIA DE AYSÉN	VILLA CERRO CHAUILLU			
Claudio Quijón C	Aseos Ambientales	Los Financeros			



LISTA DE ASISTENCIA

Villa Castillo, 31 de Agosto 2016.

**REUNIÓN: MEJORAMIENTO RUTA 7 (Obras Básicas), TRAMO: Laguna Verde - Mallines Río Ibáñez.
MEJORAMIENTO RUTA 7 (Obras Básicas), TRAMO: Mallines Río Ibáñez - Alcantarilla Cascada.**

NOMBRE	ORGANIZACIÓN	DIRECCIÓN	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
JENIFER FERRERAS SANCHEZ	AIF FARMACIA SPA.	Puerto Ibáñez.			
Guillermo Caldeira	Pob. Cerro Castillo	Cerro Castillo			
VICTOR VARGAS M.	AIF FARMACIA SPA	Puerto Ibáñez			
José Haza	A.6 El Bosque	Billoco Castillo			
José Manuel H.	Comunidad Indígena Tabor	Ciudad Lago Castillo			
MANUEL AGUILAR	OPERACION TURISTICO	VILLA C. CASTILLO			
Hector Sepulveda R.	Cabañas Tamango V.C. Castillo				
